

Getuigenis: 3 revoluties en 6 succesfactoren om een Lifeproject duurzaam te doen lukken

Life+ Project 3watEr

Coordinated by ELO



www.3watEr.eu



Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu onder het LIFE+ programma Natuur (Subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036)

Wie is de spreker?

Claude de Villenfagne

- Medestichter, enthousiaste, groene en wat revolutionaire ondervoorzitter van de VZW OVML (Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg): groep van landeigenaars en-gebruikers
- OVML gesticht in 2002 met 3 hoofddoelen:
 - Kennis en eerbied van de landgebruikers onder mekaar
 - Verdediging van hun rechten
 - Voorbeeldig beheer van de natuur- economische en culturele waarden van de streek

www.3water.eu





Het project

Life+ Project 3watEr





'Ecologische verbetering van het Vijvergebied Midden-Limburg via een nauwe samenwerking met private en publieke partners via een Triple-E aanpak'

www.3watEr.eu



Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu onder het LIFE+ programma Natuur (Subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036)

Europa, Natura2000 netwerk

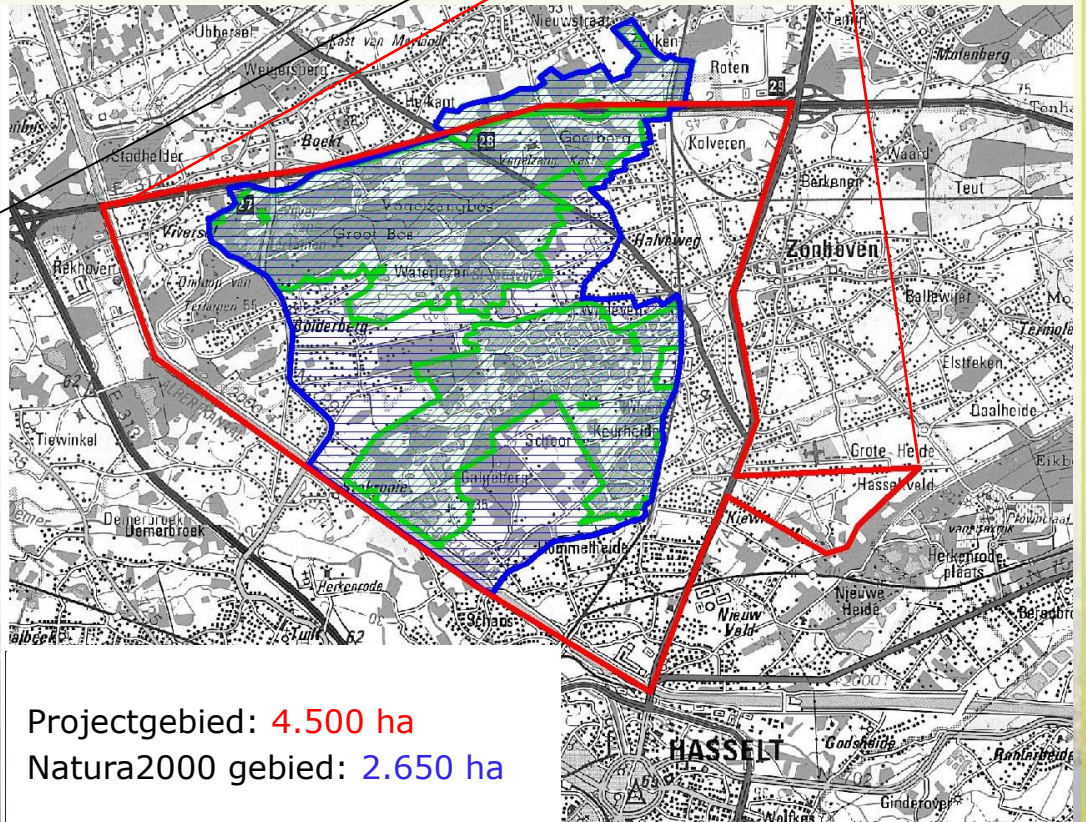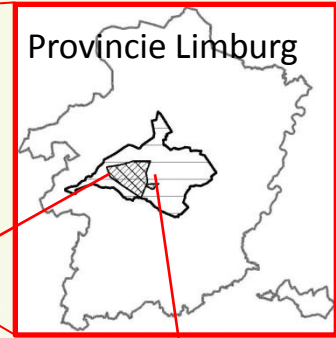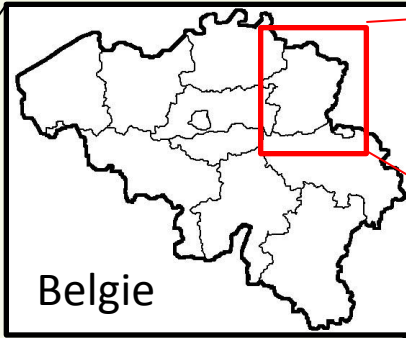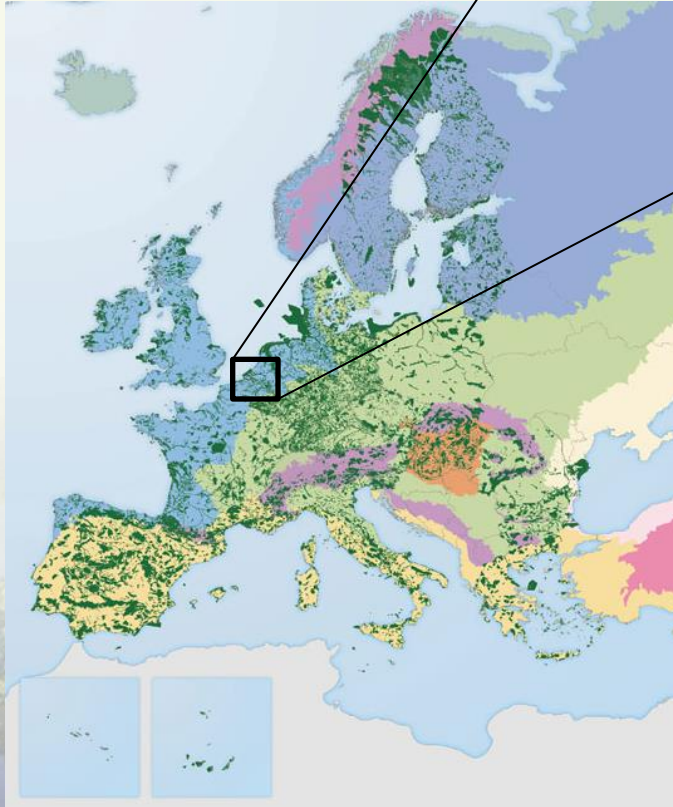

Projectgebied: 4.500 ha
Natura2000 gebied: 2.650 ha





Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)



Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

vzw Natuurpunt Limburg (NP L)

gemeente Heusden-Zolder (H-Z)



Vlaamse overheid



gemeente Zonhoven (ZON)



Provincie Limburg (Prov.)

European Landowners' Organization asbl (ELO),
coordinator

vzw Limburgs Landschap (Lila)




Limburgs Landschap vzw
gedreven door natuur



Hoofdstad van de Smaakstad Hasselt (HAS)

vzw Ontwikkeling Vijvergebied Midden Limburg (OVML)




Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

www.3watEr.eu



Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu onder het LIFE+ programma Natuur (Subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036)

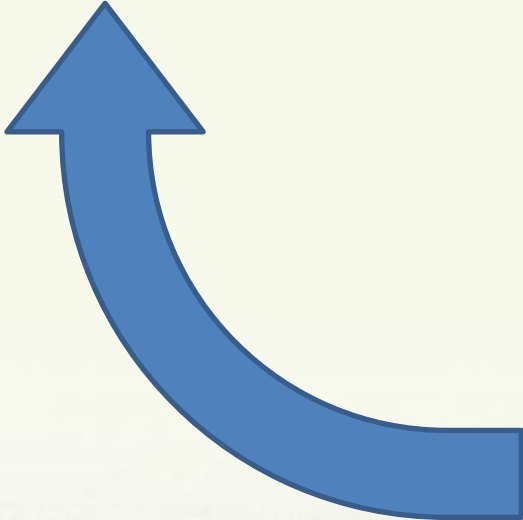

Gechiedenis in vier stappen naar een Life+

1. De oppositie: 1997-2003

Administratie en landeigenaars bestrijden mekaar: van beide kanten worden er extreme posities aangenomen

2. De bewustwording: 2003-2005

Bewustvolle PERSONEN brengen meer begrip in de standpunten. Landeigenaars oordelen dat een voorbeeldig en duurzaam beheer van de natuur tot samenwerking kan leiden.

3. De opbouw: 2005-2008

OVML wordt gesticht en behaalt het Inbev-Baillet-Latour prijs voor haar verzorgd beheer van verscheidene eigendommen

4. Het Life+project: 2009-2014

Het potentieel van de streek wijst uit naar een mogelijk lifeproject: bevestigd door contacten met ELO en met de Europese Commissie

Oproep van alle actoren leidt, na overwonnen scepticisme, tot opstelling en aanvaarding van het dossier door Europa.



Verwachte resultaten





**95% van de
objectieven zijn
bereikt**









De 5 hoofddoelen van het project 3WATER:

1. Ecologische verbeteringen: *Roerdomp, boomkikker, heide, ...* **doelstellingen bereikt voor 95%**
2. Een nauwe **samenwerking** aangaan met de private landeigenaren in het gebied en met alle andere betrokken partijen : **Europees Award voor de bereikte samenwerking**
3. Volgens een **Triple E** aanpak te werk gaan, wat staat voor een versterkt samengaan van Ecologie, Economie en Educatie: **Triple E fiches met bereikte resultaten**
4. Het brede publiek **informer**en over de inspanningen rond het behoud van de Europese natuur en biodiversiteit
5. Een **voorbeeldproject** zijn voor Europa over de samenwerking met private landeigenaren in het beheer van Europees belangrijke natuur(gebieden)

Financiering van het project

- Europa: 50%
- Vlaamse Gemeenschap : 40%
- Eigenaar : 10%

Financiering van het onderhoud

- Eigenaar met eigen middelen
(samenwerking van eigenaars)

Toekomst: Afterlife

1. Handvest ondertekend door alle partners:
« Wij werken samen om ons juweel te behouden en op duurzame wijze te onderhouden »
2. Opvolgingsfiche per eigenaar met een controle om de 6 maand

Succesfactoren

3 algemene succesfactoren

1. Vertrouwen van de Europese Commissie
2. Het project beheren als een onderneming met duidelijke doestellingen op ecologisch, economisch en educatief gebied
3. Inschakeling van de aangepaste middelen om de doelstellingen te behalen

3 specifieke succesfactoren: gebruikte middelen (1)

1. Het aanspreken van ALLE potentiële actoren van het project: Gemeenten, natuurvereniging, administratie, privé landeigenaren. Iedereen welkom, niemand is uitgesloten.
2. De samenwerking van alle actoren
 - 2.1 de algemene coördinator: ELO contacten met de Europese Commissie, de financiering en de boekhouding
 - 2.2 de steun van de Overheid: ANB
 - 2.3 een technische verantwoordelijke voor de administratie en de uitvoering der werken (Limburgs Landschap)
 - 2.4 een structuur die de landeigenaar bundelt en vertegewoordigt OVML

Succesfactoren

De specifieke succesfactoren: gebruikte middelen (2)

3. De structuur: een stuurgroep en 4 werkgroepen
 - 3.1 een stuurgroep met ALLE leden (actoren):
gemeenschappelijke beslissing en opvolging
 - 3.2 Werkgroep Communicatie: informatie van de bevolking,
infokranten en video
 - 3.3 Werkgroep Hydrologie: kwaliteit van het water als
voorwaarde voor een gezonde natuur en economie
 - 3.4 Werkgroep 3 E's: om de vereisten van educatie, economie
en ecologie in te vullen
 - 3.5 Werkgroep Management: snelle oplossingen voor
specifieke problemen en voorstellen aan stuurgroep

Knelpunten (1)

1. Gebrek aan synthetische visie: adequatie objectieven/middelen

Oplossing: betere kennis van natuurfenomenen

2. Administratieve weg om vergunningen te bekomen

Oplossing: bewuste samenwerking van de verschillende gezaghouders om de termijnen te herleiden

3. Administratieve weg om de financiering te bekomen: de betaling van de aannemers duren te lang met als gevolg de weigering om de bestelde werken uit te voeren en de laattijdigheid in de uitvoering van het programma

Oplossing: financiële controle van de coördinator naar de verantwoordelijken van de subsidiëring

Knelpunten (2)

4. Een ingewikkelde boekhouding

Oplossing: vanaf het BEGIN van het project een goedgeregelde coordinatie en controle van een stipte boekhouding (+/- om de 3 maand)

5. Breuken in de samenwerking om ideologische redenen

Oplossing : duurzaam natuur-, water- en luchtbeheer en biodiversiteit zijn een bezorgdheid waaraan iedereen dient mee te werken. Het is niet omdat privé eigenaars er hun energie aan geven dat ze om ideologische reden stokken in de wielen moeten kennen

Besluit

De realisatie van een Life+project is een fantastische ervaring en leidt tot uitzonderlijke duurzame resultaten op voorwaarde dat:

1. ALLE actoren van de behandelde streek betrokken zijn en samenwerken om de beoogde doelstellingen die zij hebben aanvaard te bereiken.
2. Een EVENWICHT wordt beoogd en bereikt tussen sociaal-culturele, economische en ecologische doelstellingen.
3. Een sterke TECHNISCHE structuur het geheel ondersteunt voor een duurzame realisatie

Bedankt voor jullie aandacht



Vragen?

www.3water.eu



Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu
onder het LIFE+ programma Natuur (Subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036)
